การลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ – บ้านป่าแดง ตำบลหนองพะยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

สัญญา : เริ่ม ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๒๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๒๔,๐๐๐,๙๒๘.๑๓ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิริยะก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๕ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๕ %

ปัญหา/อุปสรรค : ผู้รับจ้างขอหยุดงานเนื่องจากวิกฤตเรื่องน้ำมัน

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน และการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๓) ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ๔) ให้พิจารณาติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักบรรทุก เนื่องจากถนนทุกเส้นทางถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักที่จำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนเกิดความเสียหายเร็วขึ้น ๕) ให้พิจารณาเรื่องถนนที่สูงกว่าไหล่ทางจะเกิดอุบัติเหตุ แต่หากไหล่ทางสูงกว่าถนนจะเกิดน้ำขัง และเกิดหญ้าขึ้นรก เมื่อน้ำขัง ทำให้ดินทรุด ถนนแตก

แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร







โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนเขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.๑๗๒+๙๐๐ - กม.๑๗๗+๓๔๑ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔.๔๔๑ กิโลเมตร ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ สายทาง (สอดส่อง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงพิจิตร

สัญญา : เริ่ม ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๒๔,๗๘๙,๐๐๐ บาท ราคากลาง : - บาท

ชื่อคู่สัญญา : บริษัท ภูริธนา จำกัด

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๗๑ %

ปัญหา/อุปสรรค : (แขวงทางหลวงพิจิตร ได้วางแผนการก่อสร้างช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์)

ข้อเสนอแนะ : ๑) ขอให้พิจารณาจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๒) ขอให้แขวงทางหลวงพิจิตร พิจารณาป้ายจราจร/สัญลักษณ์เพื่อชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากเป็นเขตชุมชน ๓) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด






สิ้นสุด
เขตก่อสร้าง
END ROAD WORK



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

สัญญา : -

วงเงินในสัญญา : ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : - บาท

ชื่อคู่สัญญา : -

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๐ % (อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและราคาให้เป็นปัจจุบัน)

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -













โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (งบ Function)

๔. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๘,๘๖๓ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : กรมชลประทาน


สัญญา : แผนงานก่อสร้าง/งบประมาณ ระยะโครงการ ๗ ปี

วงเงินในสัญญา : ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : - บาท

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๖๔.๗๖ % (ทั้งโครงการ) ผลงานปัจจุบันปี ๒๕๖๙ : ๓๒.๐๕ %

รายละเอียด : การก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กชนิดบานโค้ง ขนาดความกว้าง ๑๒.๕๐ ม. สูง ๘ ม. จำนวน ๕ ช่อง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม และลำน้ำสาขา ประมาณ ๕.๑๐ ล้าน ลบ.ม. สำหรับการเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ตำบล ๒ อำเภอ ในจังหวัดพิจิตร

ปัญหา/อุปสรรค : ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากน้ำลดระดับช้ากว่าปกติทางโครงการฯ ได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน

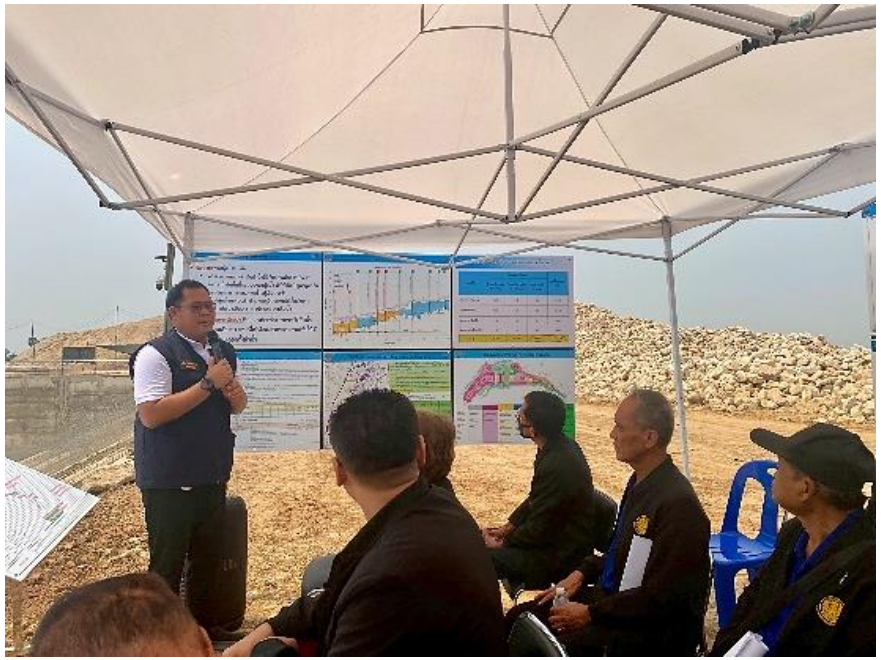











โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (งบ Function)

๕. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ระทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน ๒

ช่วง กม.๗๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๙๖ + ๗๐๐.๐๐๐๐ (สอดส่อง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : กรมทางหลวง

สัญญา : เริ่ม ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑๗ มิถุนายน ๒๕๗๑

วงเงินในสัญญา : ๙๔๖,๐๓๙,๐๐๐ บาท ราคากลาง : - บาท

ชื่อคู่สัญญา : กิจการร่วมค้า เคทีเอจี

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๒๕ %

รายละเอียด : ๑) โครงการฯ เป็นการก่อสร้างบำรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมการขนส่งจราจรระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก และเป็นทางหลวงสายรองในจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเส้นทางสายสำคัญเชื่อมการเดินทางสู่ภาคเหนือ และมีจุดเชื่อมต่อกับทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางสู่ภาคเหนือ ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานจึงมีความเสียหายค่อนข้างมากเกินกว่าการบำรุงรักษาด้วยวิธีการบำรุงตามปกติ จำเป็นต้องทำการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ๒) การก่อสร้างมีมาตรฐานความปลอดภัย มีการติดตั้งป้ายแนะนำ ป้ายเตือน และป้ายบังคับตามมาตรฐาน และได้แสดงข้อมูลเอกสารใบอนุญาตแหล่งที่มาของวัสดุตามระเบียบได้ครบถ้วน ๓) โครงการฯ ร่วมกับตำรวจในพื้นที่ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์







รายละเอียดโครงการ

โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๓๓-๐๑๖ สายคันคลองชลประทาน C๗๒ (ตอนที่๕) หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อมหล่ม ตำบลคลองคูณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ

สัญญา : ลงนาม ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๘ มีนาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๔,๙๙๗,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๖,๕๗๙,๐๑๔.๔๙ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวีณก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๐๐ % ผลงานปัจจุบัน : เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไปมา ๒) ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๗. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหาดแตงโม หมู่ที่ ๔ ตำบลงิ้วราย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

งบประมาณ : ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจาก อบต.งิ้วราย ยังไม่ได้ขออนุญาตกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้พื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และกระบวนการการอนุญาตใช้เวลานาน จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงมีความประสงค์ขอคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๙ ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท

ชื่อคู่สัญญา : -

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : -

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๘. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ ๔๖-๐๑๘ สายบ้านเขาส้าน –บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท้ายทุ่ง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

สัญญา : ลงนาม ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๘,๙๗๘,๔๘๙.๗๕ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิริยะก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๒๘ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ % เบิกจ่ายแล้ว ๘ เมษายน ๒๕๖๙

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไปมา ๒) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน และการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๓) ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ๔) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๙. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ ๓๑-๐๑๑ ถนนสายบ้านเขาทราย - บ้านเขานกยูง หมู่ที่ ๘ บ้านเขานกยูง ตำบลเขาทราย จำนวน ๓ ช่วงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

สัญญา : ลงนาม ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๘,๙๗๘,๔๘๙.๗๕ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิริยะก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๕๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ % เบิกจ่ายแล้ว ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไปมา ๒) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน และการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๓) ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ๔) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด













โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ขนาดกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ๗๘๐ ตารางเมตร หมู่ ๔ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลเขาทราย

สัญญา : ลงนาม ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๓,๑๔๖,๗๖๘ บาท ราคากลาง : ๓,๖๔๐,๙๖๗.๖๖ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางลาย ๘๘๘

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๑.๑๕ %

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) ขอให้พิจารณาเรื่องขนาดของเหล็กโครงหลังคาตามมาตรฐาน เน้นย้ำให้คงทนแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ๒) ให้พิจารณาเรื่องการทำระบบระบายน้ำฝน และทางระบายน้ำหลาก ๓) ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ๔) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


สำนักงาน
เทศบาลตำบลเขาทราย


ห้องประชุมสภา





โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโดม เทศบาลตำบลวังตะกู หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร - โครงหลังคา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๗ เมตร รางระบายน้ำยาวรวม ๘๐ เมตร –ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (สอดส่อง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลวังตะกู

งบประมาณ : ๗,๗๔๖,๐๐๐ บาท

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ยกเลิกประกาศ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว และไม่ยอมซื้อซองประกวดราคา จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผลงานปัจจุบัน : ทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๙ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำสัญญา อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างทำสัญญา ครั้งที่ ๒

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -




โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม
เทศบาลตำบลวังตะกู หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกู
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร





โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๑-๐๓๖ สายเลียบคลองส่งน้ำ ซี ๗๖-๔๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหอไกร ตำบลหอไกร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๑,๐๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (สอดส่อง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลหอไกร

สัญญา : เริ่ม ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๑,๖๙๕,๐๐๐ บาท ราคากลาง : -

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าบัวคอนกรีต (๘๘๘)

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๐ %

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -


We are
Ho krai
Team





โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๓. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าตะกู หมู่ที่ ๘ ตำบลบางไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

สัญญา : ลงนาม ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท **ราคากลาง :** ๒,๖๗๐,๘๐๑.๔๒ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นสินสุวรรณ (๑๙๙๖)

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % **ผลงานปัจจุบัน :** ๑๐ %

รายละเอียด : ณ วันที่ลงตรวจติดตาม ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากประปาเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชนในหมู่บ้าน คุณภาพน้ำมีลักษณะเป็นสีสนิม และต้องล้างถังพักน้ำทุกสัปดาห์ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ : ๑) เร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด ๒) หลังส่งมอบงานแล้ว ให้ทาง อบต.ตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ











โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๔. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พจ.ถ.๓๒-๐๐๙ สายคลองโนน คลองโพธิ์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนตาเวช - หมู่ที่ ๕ ตำบลโรงช้าง ตำบลคลองคะเชนทร์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๙๒.๐๐ ตารางเมตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลคลองคะเชนทร์

สัญญา : ลงนาม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๖,๖๔๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๖,๖๖๘,๒๕๗.๓๙ บาท

ชื่อคู่สัญญา : บริษัท วงศ์สระหลวงก่อสร้าง จำกัด

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ % เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๙

ปัญหา/อุปสรรค : ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้ ทต.คลองคะเชนทร์ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามกำหนดเวลา ให้มีการติดตั้งป้ายแสดงการก่อสร้าง และป้ายเตือนต่างๆ และเร่งรัดให้งานเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการสัญจร ๒) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓) ให้ดูเรื่องจุดเชื่อมต่อทางเข้าบ้านประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ๔) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชนและการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๕. รถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด ๗ เมตร (Aluminum Bus Produced from stamping and extrusion molding, The length ๗ meters) ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(สอดส่อง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลบาลตำบลหัวดง

เงินงบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับสำนักงบประมาณ)

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑) ทต.หัวดง จัดซื้อรถโดยสารอลูมิเนียม ๒๐ ที่นั่ง ที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยตามบัญชีนวัตกรรม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง นักเรียนด้อยโอกาสเข้ามาเรียนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและคณะของเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานในระยะทางใกล้ๆ และให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย ๒) ณ วันที่ลงตรวจติดตาม ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นบัญชีนวัตกรรม ได้ประกาศเชิญชวนไป ๒ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา และได้มีการสอบถามติดตามเกี่ยวกับการส่งเอกสารเชิญชวนแล้ว สิ้นสุดประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อไม่ให้เงินพับตกไป ทต.หัวดง จะพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยการจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือจังหวัดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อเสนอแนะ : ๑) การจัดซื้อรถโดยสาร จำนวน ๒๐ ที่นั่ง เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสเพื่อให้ได้เข้ามารับการศึกษาและการศึกษาดูงาน ตามวัตถุประสงค์ของ ทต.หัวดง ๒) ให้ ทต.หัวดง หารือสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ในกรณีบัญชีนวัตกรรมที่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


โครงการจัดงาน
วันเทศบาล
ประจำปี 2567



โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมชุมชนบนความหลากหลายชาติพันธุ์ของชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง โดยจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ พร้อมฐานรากเหล็ก ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลบาลตำบลหัวดง

สัญญา : ลงนาม ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๙,๙๒๓,๒๐๐ บาท ราคากลาง : -

ชื่อคู่สัญญา : เวย์คอเปอร์เรชั่น

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๐ %

รายละเอียด : ๑) การติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทต.หัวดง เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และใช้บัญชีนวัตกรรม เนื่องจากมีความคุ้มค่า และการรับประกันในระยะยาว (๕ ปี) สามารถลดงบประมาณที่ ทต.หัวดง ใช้ในการซ่อมบำรุงได้ ๒) ณ วันที่ลงตรวจติดตาม ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นบัญชีนวัตกรรม อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๓) พบปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการบางจุดอยู่ในเขตแขวงทางหลวงพิจิตร จึงต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากแขวงทางหลวงพิจิตร ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ซึ่ง ทต.หัวดง ได้เร่งรัดดำเนินการและหารือจังหวัดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อเสนอแนะ : ๑) เร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด ๒) หลังส่งมอบงานแล้ว ให้ทาง อบต.ตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ





โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๗. รถดับเพลิง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

(สอดส่อง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

สัญญา : ประกาศผู้ชนะวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ รอพ้นอุทธรณ์ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ คาดว่าจะลงนาม วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งบประมาณ : ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑) ณ วันที่ลงตรวจติดตาม ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการอุทธรณ์ผู้ชนะเสนอราคา และได้ยกเลิกประกาศผู้ชนะ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้พิจารณาผลข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ ผู้เสนอราคาไม่ได้ยื่นผล test ที่เกี่ยวกับระบบท่อน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ และระบบวาล์วน้ำ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ๒) ตัวรถและอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ๓) พบปัญหาจำนวนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (นายช่าง) ซึ่งส่งผลกับการตรวจรับงาน เพื่อให้ได้รถและอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่ง อบต.คลองทราย ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันสาธารณภัย ทาง อบต. ได้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมอย่างถูกต้องไว้รองรับแล้ว

ข้อเสนอแนะ : ขอให้ อบต.คลองทราย เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว และให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

174

บริษัท ทรัพย์เพิ่ม ออโต้ โมทีฟ จำกัด


22/2 หมู่ที่10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 080-6987995, 02-1155675 อีเมล์ : Subpeam.automotive@gmail.com

รูปแบบรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร



หมายเหตุ รูปแบบแสดงเฉพาะลักษณะของถังบรรทุกน้ำเท่านั้น ลักษณะของรุ่นรถ และรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ให้เป็นไปตามที่เสปกกำหนด

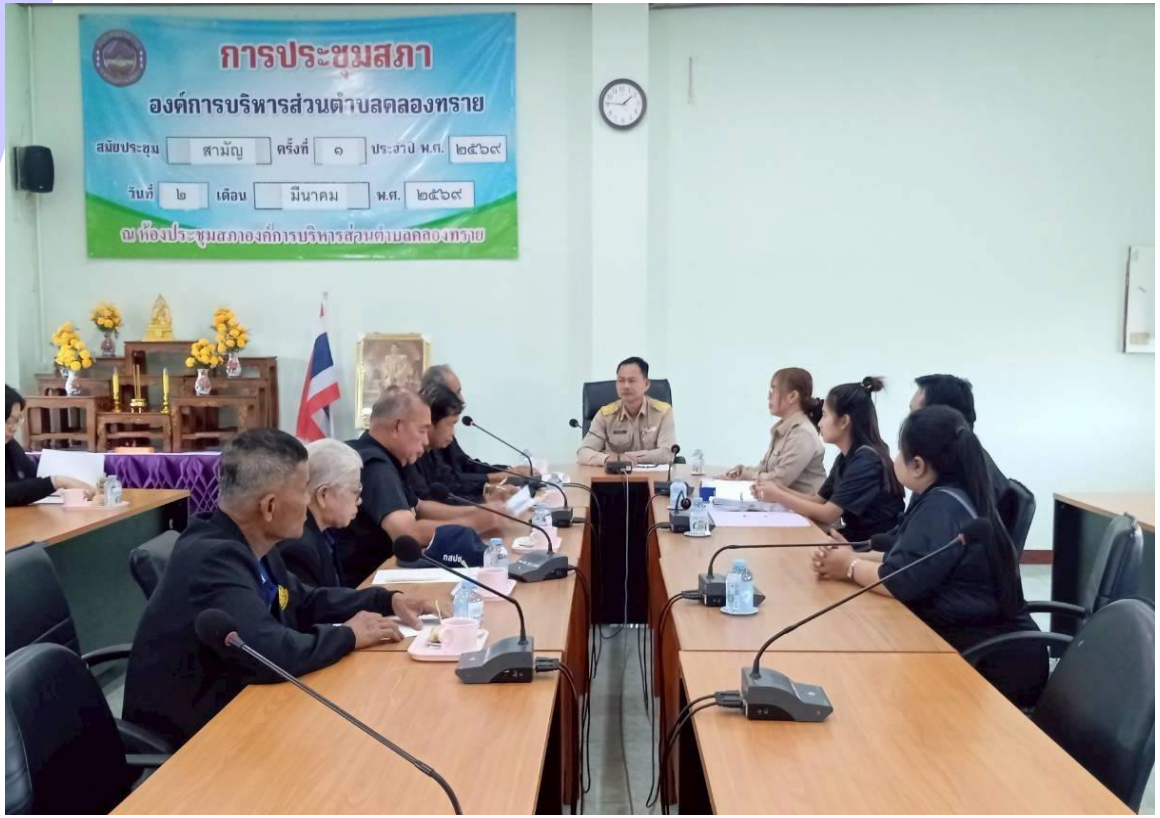

โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๘. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN–PLACE RECYCLING) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ ๑๐๐-๐๓ สายบ้านไดรังใต้หมู่ที่ ๕ -บ้านห้วยน้ำโจนเหนือ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำโจนเหนือ ตำบลห้วยร่วม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม

สัญญา : ลงนาม ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๖,๖๕๐,๔๗๖.๙๕ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๐๐ % ผลงานปัจจุบัน : เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙


รายละเอียด : ๑) โครงการฯ เป็นการปรับปรุงเสริมผิวทางเดิม อบต.ห้วยร่วม ชี้แจงว่าถนนเดิมใช้งานมานาน มีการชำรุด ถนนมีลักษณะถมสูงเป็นคันดิน ด้านข้างมีน้ำท่วมขังตลอดทำให้พื้นที่เกิดการยุบตัวได้ง่าย เกิดการแตกร้าวและแตกหักง่าย ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา ๒) ณ วันที่ลงตรวจติดตาม พบการติดตั้งป้ายไวนิลแสดงรายละเอียดโครงการ และพบว่าในบางจุดถนนมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาว และลาดยางไม่เรียบ

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้ อบต.ห้วยร่วม แจ้งผู้รับจ้างเข้าแก้ไขรอยแตกร้าว จุดที่พื้นผิวไม่เรียบ ในฤดูฝนอาจมีปัญหาน้ำขัง และเน้นย้ำการตรวจสอบแก้ไขตลอดการประกันสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการใช้งานของประชาชน ๒) เนื่องจากถนนมีความโค้งและเป็นคันดินสูง บริเวณทางโค้ง ไม่มีอุปกรณ์กั้น ขอให้ อบต.คลองทราย พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์แผงกั้นกันตก สำหรับชะลอความเร็วและป้องกันรถเสียหลักพุ่งตกไหล่ทาง และไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อป้องอันตรายในการสัญจรของประชาชน







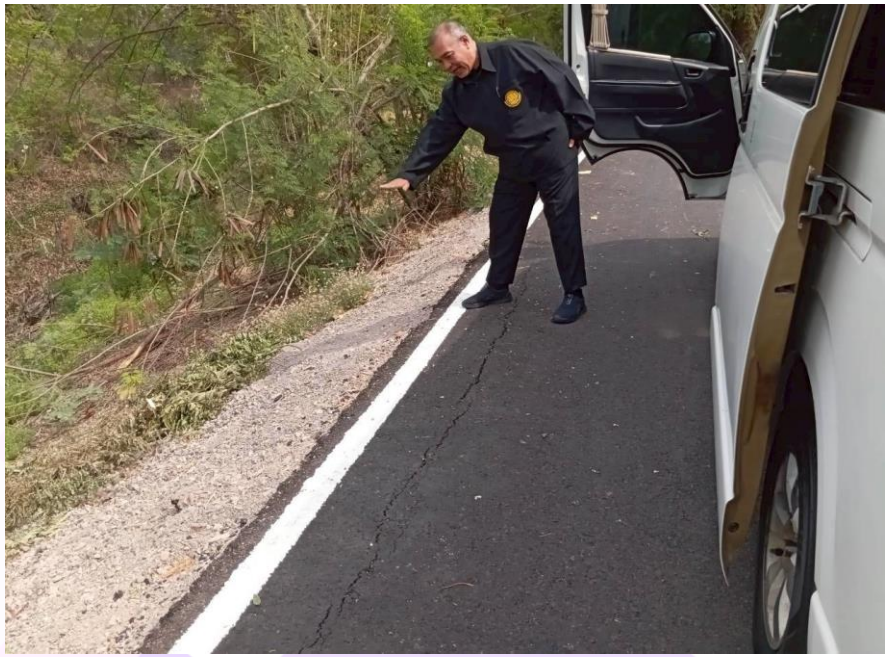


กจ 7769



โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๙. ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๙๙-๐๐๑ สายบ้านห้วยพุก - บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๖ บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๙๒ ตารางเมตร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

สัญญา : ลงนาม ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๙,๐๙๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๙,๑๑๔,๖๓๖.๐๒ บาท

ชื่อคู่สัญญา : บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๐ % (แจ้งเข้างาน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙)

รายละเอียด : เป็นถนนเส้นหลักของตำบลสำหรับการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมต่อ ๔ หมู่บ้าน และเชื่อมต่อไปถนนสาย ๑๑ และอำเภอดงเจริญ ซึ่งถนนเดิมใช้งานมาหลายสิบปี เกิดการชำรุดและมีน้ำขัง มีการทรุดและยุบตัวเป็นระดับการแตกร้าวชัดเจน

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้ อบต.ห้วยพุก เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันตามแผนที่กำหนด และให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน ๓) ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๒๗-๐๐๒ สายบ้านวังปลายนา-บ้านกุดระกำ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดระกำ ตำบลสำนักขุนเณร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๔๐ ตารางเมตร (สอดส่อง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

สัญญา : ลงนาม ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าบัวคอนกรีต (๘๘๘)

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๓๔ % ผลงานปัจจุบัน : ๖๐ %

รายละเอียด : (หน้าถัดไป)

โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียด : ๑) พื้นที่โครงการฯ เป็นถนนเส้นหลักของประชาชนที่เชื่อมต่อ ๒ หมู่บ้าน และเป็นเส้นทางสายรองเพื่อเชื่อมต่อไปยังอำเภอดงเจริญ โรงพยาบาลดงเจริญ และเชื่อมไปยังเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งถนนเดิมใช้งานมาหลายสิบปี เกิดการชำรุดและมีน้ำขัง มีการทรุดและยุบตัวเป็นระดับการแตกร้าวชัดเจน ๒) สำหรับเงินเหลือจ่าย ทต.สำนักขุนเณร ได้โอนตั้งจ่าย ๒ รายการ ประกอบด้วย (๑) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรย้อย และ (๒) โอนไปเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน และโครงการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รายงานสำนักงบประมาณ และจังหวัดพิจิตร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ๓) ณ วันที่ลงตรวจติดตาม ผลงาน ๓๔% เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด มีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและเหมาะสมตามห้วงเวลาได้ขุดลอกหน้าดินและบดอัด รอเทคอนกรีต ระหว่างก่อสร้างรถเล็กสมารถผ่านได้ ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน มีเส้นทางขนานที่หลบเลี่ยงการจราจรได้ ๔) พบการติดตั้งแผ่นป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ ใน ๒ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ

ข้อเสนอแนะ : ๑) ชื่นชมการดำเนินงานของ ทต.สำนักขุนเณร ซึ่งผู้บริหารและข้าราชการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีความคืบหน้าและต่อเนื่อง และได้นำเงินเหลือจ่ายไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ๒) ให้ ทต.สำนักขุนเณร เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน และการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๔) ในส่วนของการตรวจรับงานจ้าง ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบด้วยความละเอียดครบถ้วนตาม TOR เพื่อความโปร่งของหน่วยงานและบุคลากร ๕) ให้พิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักบรรทุก เนื่องจากถนนทุกเส้นทางถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักที่จำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนเกิดความเสียหายเร็วขึ้น












WMmesh
STEEL WIRE MESH FOR
CONCRETE REINFORCEMENT
CDR 6.0x6.0
Spacing : @ 200x200 mm.
Size : # 2.00x5.00 m.
QTY : 50 Sheet/Roll
Wire mesh Job no. :
Machine : MP_78
Date : 11/03/26
TIS. 737-2549

โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๑. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๔๓-๐๐๙ สายทุ่งใหญ่ - แยกบ้านยายเบียบ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินย่าทร ตำบลท่าขมิ้น ผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๔๔.๐๐ตารางเมตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น

สัญญา : ลงนาม ๘ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๔,๕๔๗,๙๓๙.๖๗ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าบัวคอนกรีต (๘๘๘)

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๔๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ % อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) พบการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ๓) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชนและการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๔) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไป ๕) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด




ขออภัยในความไม่สะดวก
ทางกำลังก่อสร้าง
หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น







โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๒. โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ ๑๘ - ๐๑๕ สาย บ้านสัปโคน หมู่ที่ ๕ บ้านวังตะโกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลบางคลาน

สัญญา : ลงนาม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๓,๑๕๑,๓๐๒ บาท ราคากลาง : ๔,๖๓๒,๒๑๓.๓๙ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๙๑.๔๓ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ % เบิกจ่ายแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) พบการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ๓) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน และการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๔) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไป ๕) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


เทศบาลตำบลบางคลาน









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๔๗-๐๑๔ สายถนนลาดยาง พจ.ถ.๔๗-๐๐๑ (ประดู่ลาย) หมู่ที่ ๒ - ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท ๔๐๕๔ (หนองแฟบ) หมู่ที่ ๗ บ้านกระบังดิน ตำบลท้ายน้ำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(สอดส่อง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ

สัญญา : ลงนาม ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๖,๓๓๓,๙๐๓.๐๒ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี อาร์ ที เทรดดิ้ง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๕ % ผลงานปัจจุบัน : ๗๕ %

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) พบการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ๓) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน และการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๔) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไป ๕) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๕๖-๐๒๒ สายคันคลองหนองขี้หนอน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลายกำหนด อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

สัญญา : ลงนาม ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๑,๙๑๙,๒๐๐ บาท ราคากลาง : ๒,๖๖๕,๕๙๕.๑๔ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจ คอนกรีต

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๙๖ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ % เบิกจ่ายแล้ว

รายละเอียด : ณ วันที่สอดส่อง เหลือเทดินไหล่ทาง

ข้อเสนอแนะ : ๑) การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง การก่อสร้างได้ขนาดความกว้างและมีความหนาของคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดของงานที่กำหนด ๒) พบการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๓) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไปมา ๔) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด




องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
ยินดีต้อนรับ




โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร. 0-5690-2889
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 56-022 สายคันคลองหนองขี้หนอน หมู่ 4 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบางลาย
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,300 ตารางเมตร และลงไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
งบประมาณ 1,919,200.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา 24 ธันวาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 22 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน พอใจ คอนกรีต
ผู้ควบคุมงาน
1.นายเกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2.นายนภดล ทับทอง ผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.นายไพศาล มณีขวัญ ประธานกรรมการ
2.นางสาวเกวลี อ่อนจันทร์ กรรมการ
3.นางสุปราณี ศรีบรรเทา กรรมการ









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๕. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยงานเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๘๓-๐๑๓ สายแยก พจ.ถ.๘๓-๐๐๑ บ้านคุยกระชาย-หลังวัดวังตะขบ (พร้อมก่อสร้างสะพาน) หมู่ที่ ๗-๘ บ้านวังตะขบ-บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์

สัญญา : ลงนาม ๗ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๔,๙๙๙,๙๑๔.๔๔ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % (ปรับหน้าดิน,จัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง) ผลงานปัจจุบัน : ๑๖.๐๘ %

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๒) พบการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๓) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไปมา

















โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๖. ก่อสร้างหอกระจายข่าว (เสียงไร้สาย) ในเขตตำบลวังโมกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์

สัญญา : ลงนาม ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๑,๙๓๕,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๑,๙๗๐,๐๕๔.๕๙ บาท

ชื่อคู่สัญญา : บริษัท อินทิเกรชั่น ดีเวลลอปเมนท์

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๙๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ % เบิกจ่ายแล้ว


รายละเอียด : พบการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ : ๑) เน้นการเปิดเสียงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างรับรู้ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

๒) เน้นย้ำเรื่องการดูแลรักษาหลังการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว หรือในระยะเวลาข้างหน้า

อบต.วังโมกข์


องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
๓๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๔๐
งานก่อสร้าง
ก่อสร้างหอกระจายข่าว (เสียงไร้สาย) ในเขตตำบลวังโมกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ปริมาณงาน
ก่อสร้างหอกระจายข่าว (เสียงไร้สาย) ในเขตตำบลวังโมกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โดยก่อสร้างหอกระจายข่าว (เสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายผ่าน IP NETWORK หรือ ๔G
ชุดเครื่องรับเสียงเสียงไร้สายชนิด IP NETWORK หรือ ๔G ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒๗ ชุด
ผู้รับจ้าง
บริษัท อินทิเกรชั่น ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์)จำกัด
สัญญา
๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙
ระยะเวลา
เริ่มสัญญา วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
ค่าก่อสร้าง
๑,๗๓๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. พันจ่าเอกประเสริฐ วงค์รอด ประธานกรรมการ
๒. นายทศพร อ่อนดี กรรมการ
๓. นางสาววริยา หวาจ้อย กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
๑. นายเปรมศักดิ์ แพรนก้ว
งานก่อสร้างรายการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน

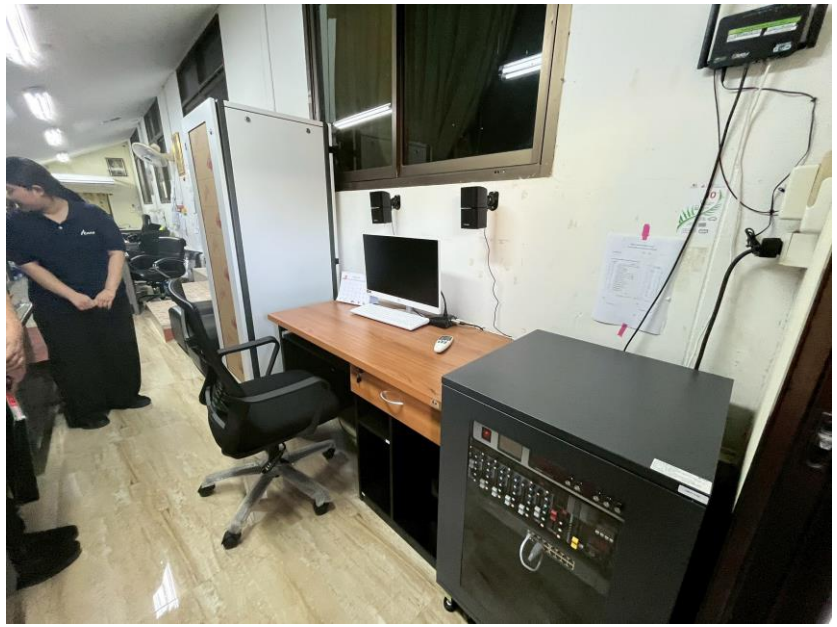






ตู้ควบคุมระบบเสียงไร้สาย
อบต. วังโมกข์

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๗. ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคลองพันจอ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแพงดิน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

งบประมาณ : ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ณ วันที่ลงตรวจติดตาม ทาง อบต.กำแพงดินได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ L ดังกล่าวครบกำหนดอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ มีบริษัทผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย คือบริษัท คิดพร้อมทำ จำกัด ผู้แทนจำหน่าย คือ บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดอายุกำหนดสิทธิดังกล่าวต้องดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลงานปัจจุบัน : ๑) อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบเนื่องจากอยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบเนื่องจากบัญชีนวัตกรรมหมดอายุ อบต.กำลังจัดทำประมาณราคาและแบบรูปรายการใหม่ ๒) ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รอพ้นอุทธรณ์ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๙ คาดว่าลงนามได้ ๒๙ พ.ค.๖๙







โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๘. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ ๙๔-๐๐๓ สายบ้านหนองโสน - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑,๖ บ้านหนองโสน, บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

สัญญา : ลงนาม ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๘,๒๓๓,๗๒๔ บาท ราคากลาง : ๘,๓๖๕,๔๑๐.๕๘ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๐๐ % ผลงานปัจจุบัน : เบิกจ่ายแล้ว ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

รายละเอียด : ๑) พบการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

ข้อเสนอแนะ : ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไป

อบต.หนองโสน











โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพจ.ถ.๑๗-๐๖๒ ถนนบ้านบึงน้อย ต.เนินปอ - บ้านหนองสะเดา ต.บ้านนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลเนินปอ

สัญญา : ลงนาม ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๔,๔๘๕,๗๘๘.๒๐ บาท

ชื่อคู่สัญญา : บริษัท ทรายดี บ้านนา จำกัด

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๔๗.๖๙ %

ปัญหา/อุปสรรค : ณ วันที่สอดส่องผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากวิกฤตน้ำมัน

ข้อเสนอแนะ : ๑) เน้นย้ำเรื่องการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) เน้นย้ำเรื่องการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๓) ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ๔) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชนและการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๔) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไป







โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๖๕-๐๐๖ สายคลองพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังปลากด ตำบลไผ่ท่าโพ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘,๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

สัญญา : ลงนาม ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๓,๑๔๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๔,๒๒๕,๑๑๓.๒๙ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมายดั่งใจ

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๘๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๑๐๐ %

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) พบการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ๓) ระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยชุมชน และการป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ๔) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไป




ปิดทางน้ำคราว





อบต.ไผ่ท่าโพ









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓๑. ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายผ่านอินเตอร์เน็ต ภายในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน ๓๐ จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

สัญญา : ลงนาม ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓ มีนาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๒,๖๔๒,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๒,๖๗๖,๔๐๐ บาท

ชื่อคู่สัญญา : บริษัทบูรพา โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๐๐ % ผลงานปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) เน้นย้ำทาง อบต.ให้มีการเปิดเสียงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างรับรู้ ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด


ยินดีต้อนรับ
Welcome
บริการด้วยใจ
ใส่ใจประชาชน









โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓๒. โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

(สอดส่อง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลหนองปล้อง

สัญญา : ลงนาม ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๙ กันยายน ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๕,๓๙๔,๐๐๐ บาท ราคากลาง : -

ชื่อคู่สัญญา : บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๐ % ผลงานปัจจุบัน : ๑ %

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) เน้นย้ำเรื่องการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) ให้ทาง ทต. ตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ ๓) เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง รวมทั้งกำชับและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง






ขนาดและกำลังการผลิตของระบบผลิตน้ำประปา Pog Tanks
WATER POG
POG S ระบบขนาดเล็ก
• รองรับ 30 - 50 ครัวเรือน
• กำลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./ชม.
• พื้นที่ติดตั้ง 6.5 x 8 เมตร
POG M ระบบขนาดกลาง
• รองรับ 51 - 120 ครัวเรือน
• กำลังการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.
• พื้นที่ติดตั้ง 7 x 9 เมตร
POG L ระบบขนาดใหญ่
• รองรับ 121 - 300ครัวเรือน
• กำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม.
• พื้นที่ติดตั้ง 9 x 11.5 เมตร



โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓๓. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว บ้านเนินหัวโล้ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลหนองปล้อง

สัญญา : ลงนาม ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๔๙๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๔๙๘,๕๐๐ บาท

ชื่อคู่สัญญา : บริษัท บีเอ็มเค ซีซีทีวี จำกัด

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๐๐ % ผลงานปัจจุบัน : เบิกจ่ายแล้ว ๗ มกราคม ๒๕๖๙

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ๒) การดูแลหลังการขาย แนะนำวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของ อบต. ๓) ให้ดูเรื่องมุมกล้องให้สามารถมองเห็นได้ในทิศทางที่เป็นจุดอับการมองเห็น จุดที่เป็นทางแยก ให้สามารถมองเห็นได้ครอบคลุมพื้นที่










CCTV



โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓๔. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๙๒-๐๑๒ สายบ้านทับไทร- บ้านใหม่เนินสวรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านทับไทร ตำบลหนองปลาไหล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๒๕ ตารางเมตร อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (สอดส่อง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙)

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

สัญญา : ลงนาม ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

วงเงินในสัญญา : ๔,๖๓๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง : ๔,๖๔๕,๒๓๕.๔๓ บาท

ชื่อคู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิริยะก่อสร้าง

ผลงาน ณ วันที่สอดส่อง : ๑๐๐ % ผลงานปัจจุบัน : เบิกจ่าย ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายละเอียด : ๑) พบการติดตั้งป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีการติดตั้งป้ายถาวรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ๒) ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

ข้อเสนอแนะ : ๑) ให้พิจารณาเรื่องการเผื่อพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไป ๒) ให้พิจารณาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า - ออก หน้าบ้านประชาชน













จบการนำเสนอ
